Basic-Fit

Cahier des charges

SAE 205

SELLA Alexandre, CHERIF Yanïs, MERLIN Anthony
Avril 2026

Tableau des versions

Version	Date	Auteur(s)	Description des modifications
0.1	03/04/2026	SELLA A.	Création du document, trame et sommaire
0.2	08/04/2026	CHERIF Y.	Présentation société + système informatique actuel
0.3	11/04/2026	MERLIN A.	Présentation du projet + diagramme d'activité
0.4	15/04/2026	SELLA A.	Organisation MOA/MOE + analyse de l'existant
0.5	17/04/2026	CHERIF Y.	Diagramme de déploiement + besoins non fonctionnels
0.6	19/04/2026	MERLIN A.	Diagramme UC + descriptions textuelles + séquence
0.7	21/04/2026	SELLA A.	Étude des solutions + risques + hiérarchisation
0.8	22/04/2026	Équipe MOE	Relecture croisée, corrections orthographiques
0.9	23/04/2026	MERLIN A.	Planning prévisionnel + annexe maquettes
1.0	24/04/2026	Équipe MOE	Version finale remise à la MOA

Sommaire

Tableau des versions 1
Présentation de la société Basic-Fit 4
L’entreprises 4
Système informatique actuel 5
Présentation du projet 6
Contexte et Problématique 6
Objectifs du nouveau système 6
Périmètre et Contraintes techniques 6
Échéances 6
Organisation du projet 7
Le Commanditaire (Bailleur) 7
La Maîtrise d’Ouvrage (MOA) 7
La Maîtrise d’Œuvre (MOE) 8
Les autres acteurs consultatifs 8
Analyse de l'existant 9
Le fonctionnement actuel sur le terrain 9
Les dysfonctionnements et limites du système 9
Améliorations attendues 10
Besoins fonctionnels 11
Identification des acteurs 11
Diagramme des Cas d’Utilisation (Use Case) 11
Diagramme d'activité 18
Diagrammes de séquences 19
Besoins non fonctionnels 20
Fonctionnement local (Mode hors-ligne) 20
Synchronisation asynchrone 20
Compatibilité matérielle 20
Responsive Design 20
Sécurité et gestion des droits 20
Performance 21
Contrainte de délais 21
Étude des solutions, Risques et Hiérarchisation 22

Étude de la solution technique et méthodologique 22
Étude rapide des risques 22
Hiérarchie dans les besoins 24
Planning prévisionnel 25
Annexe — Maquettes principales 26
Glossaire 30

Présentation de la société Basic-Fit

L’entreprises

Basic-Fit est une chaîne de salles de fitness néerlandaise, fondée en 1984 aux Pays-Bas. Elle est devenue leader des salles de sport en Europe en 2019 et en compte 1 628 en juin 2025.

Son siège social français se trouve à Wasquehal.

L'entreprise a été fondée en 1984 par René Moos, ancien tennisman, qui ouvre en périphérie d’Amsterdam un club de tennis puis une salle de sport adjacente. En 2004, la société créé la marque HealthCity avec un positionnement moyen de gamme, puis HealthCity Basic avec un modèle low-cost. La marque Basic Fit est acquise en 2010 et dispose alors de 28 clubs. La société s'implante en France et en Espagne en 2011 via une acquisition.

En 2013, le fonds d'investissement 3i acquiert une participation majoritaire. Il introduit la chaîne de salles de sport à la bourse d'Amsterdam en 2016, celle-ci compte alors 1 million de membres.

En 2022, la société s'implante en Allemagne.

En juin 2025, l’enseigne comptabilise 4,5 millions de membres. Elle possède 1 628 salles dont 243 aux Pays-Bas, 231 en Belgique, 10 au Luxembourg, 883 en France, 38 en Allemagne et 223 en Espagne.

En octobre 2025, Basic-Fit annonce l'acquisition de Clever Fit, une entreprise allemande ayant 500 salles de sport.

En mars 2025, Basic-Fit annonce son partenariat avec le Tour de France, le Tour de France Femmes, Paris-Nice ainsi que le Critérium du Dauphiné, jusqu'en 2028. Sur le Tour de France hommes et femmes, Basic-Fit sera partenaire du classement par équipes.

Aujourd’hui, les réservations de cours ne sont possibles que par téléphone, par mail ou sur le site d’un club spécifique. Le groupe va développer une possibilité de réservations en ligne sur l’ensemble des clubs, mais en conservant une validation par le club implique.

Système informatique actuel

Le système du groupe (Siège à Wasquehal)

Le système central, situé au siège, abrite principalement la gestion des achats du groupe et le site Web

Il s'appuie sur un serveur Apache installé sur un NAS professionnel (QNAP GM 1002) équipé de 20 baies, 32 Go de RAM DDR4 et de processeurs Intel Xeon. Le réseau comprend 35 ordinateurs connectés en local (type MSI PRO DP21) et est protégé par un pare-feu pour les connexions entrantes et sortantes.

Le site Web est développé avec le framework Laravel et couplé à une base de données SQLSERVER. Pour la gestion de la comptabilité et de la paie, le groupe utilise le progiciel Cegid Quadra Entreprise. Une API dédiée gère la partie achat/vente de matériels et accessoires. Enfin, un logiciel local appelé PlanCours permet de gérer le planning des cours et d'alimenter le site Web

Ce système est géré par une équipe de 5 personnes, comprenant un responsable du système d'information, un administrateur de base de données, un chef de projet et deux développeurs/intégrateurs.

Le système local (Dans les 883 clubs en France)

Chaque club bénéficiant d'une certaine indépendance, les choix logiciels et matériels sont souvent faits localement.

L'infrastructure type d'un club est composée d'un serveur local (HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus) et de 2 à 12 terminaux (parfois anciens) répartis entre la gestion du club et la réservation des cours. La qualité du réseau est inégale : tous les clubs ne disposent pas de la fibre, certains fonctionnent sous ADSL (5 mégabits) ou se trouvent en zone blanche avec de mauvaises connexions.

Chaque club est équipé de la suite bureautique Microsoft. On y retrouve souvent une version allégée du logiciel de paie Cegid Quadra, le logiciel SAGE point de vente pour le suivi des recettes, et divers outils développés sous Excel pour le suivi des réservations.

En règle générale, chaque club dispose de deux informaticiens (un responsable du SI et un profil technique pour le réseau). Il est à noter que tout le personnel n'est pas formé aux outils informatiques.

Présentation du projet

Contexte et Problématique

Actuellement, au sein des 883 clubs Basic-Fit répartis sur le territoire français, la gestion des plannings et des réservations de cours (qu'ils soient individuels ou collectifs) souffre d'un manque de centralisation et d'optimisation. L'inscription des adhérents s'effectue exclusivement de manière physique à l'accueil des clubs, par téléphone ou par e-mail. De plus, les plannings sont gérés manuellement par chaque club, le plus souvent sur des supports papier ou via des fichiers Excel. Cette méthode artisanale limite considérablement l'efficacité du personnel, complique le suivi des inscriptions (et des paiements associés) et ne permet pas d'avoir une vision globale et en temps réel de l'occupation des salles.

Objectifs du nouveau système

Pour pallier ces dysfonctionnements, le présent projet vise à concevoir et déployer un nouveau logiciel de suivi des réservations de cours. Cet outil a pour vocation d'équiper de manière uniforme l'ensemble des clubs français de l'enseigne. Dans un premier temps, l'application sera à usage strictement interne, manipulée par le personnel de Basic-Fit. Toutefois, elle devra être développée de manière "responsive" (adaptable) afin de garantir une accessibilité future sur divers supports tels que les tablettes ou les smartphones.

Périmètre et Contraintes techniques

L'intégration de cette nouvelle solution logicielle s'accompagne de contraintes techniques strictes. Le système devra s'implanter sur l'architecture locale de chaque club sans perturber ni modifier les terminaux déjà existants, qui sont dédiés à la gestion globale et aux achats. Par ailleurs, le serveur central du siège n'ayant pas la capacité de supporter une connexion simultanée et permanente des 883 clubs, la solution logicielle devra fonctionner de manière locale. Les échanges de données avec le système central (le logiciel PlanCours) se feront de manière asynchrone, via des transferts d'informations limités et ponctuels, afin d'éviter toute surcharge réseau.

Échéances

Le projet est soumis à un calendrier rigoureux, avec une date de mise en production dans l'ensemble des clubs fixée au début du mois de janvier 2027.

Organisation du projet

Le bon déroulement de ce projet repose sur une définition claire des rôles de chaque intervenant, répartis entre la Maîtrise d'Ouvrage (porteuse du besoin) et la Maîtrise d'Œuvre (en charge de la réalisation).

Le Commanditaire (Bailleur)

Le projet est initié et validé par la direction de l'enseigne :

- **Monsieur SIMON Jean-Marc** : Directeur de Basic Fit.

La Maîtrise d’Ouvrage (MOA)

La MOA représente les futurs utilisateurs du système. C'est elle qui valide que le logiciel répond bien aux attentes du terrain. La représentante officielle de la MOA est :

- **Madame LACROIX Aurélie** : Représentante des employés de l’accueil (Club de Mâcon).

Elle est encadrée par une équipe de responsables assurant la cohérence fonctionnelle et financière :

- **Monsieur GIGNOUX Jean Paul** : Responsable du SI du club de Mâcon.
- **Monsieur VERNE Jean Paul** : Responsable du SI du club de Pringy.
- **Monsieur MANIGLIER Bertrand** : Responsable du club d’Annecy.
- **Monsieur JOSSERAND Bernard** : Responsable du service financier d’Annecy.

La Maîtrise d’Œuvre (MOE)

La MOE est l'équipe chargée de concevoir, développer et déployer la solution technique. Elle est composée de 3 membres du service informatique de Basic Fit : **Monsieur MERLIN Anthony, Monsieur SELLA Alexandre et Monsieur CHERIF Yanïs.**

- **Le Chef de projet** : Le responsable du système d’information du siège est nommé à ce poste. Bien qu'il n'ait jamais conduit de projet de développement informatique pur, il possède de solides compétences en management et en gestion de projet classique. Une lettre de mission détaillée définira précisément son rôle. Le choix de la méthode de développement (agile, processus unifié...) reste à définir par l'équipe.

Les autres acteurs consultatifs

Pour s'assurer que toutes les spécificités métiers soient prises en compte, d'autres acteurs du terrain seront consultés lors de la phase d'analyse :

- **Monsieur SEGERS Jules** : Représentant des employés moniteurs.
- **Monsieur BASTO Hugo** : Représentant des responsables des plannings (Club de Mâcon).
- **Monsieur BEAUDRUN Hugo** : Représentant des développeurs du service informatique (Club de Mâcon).

Analyse de l'existant

Le fonctionnement actuel sur le terrain

Concrètement, au sein des clubs, la prise de réservation se gère de façon entièrement artisanale. L'adhérent fait sa demande à l'accueil (physiquement, par mail ou par téléphone), et l'employé saisit l'inscription sur un planning au format papier ou sur un fichier Excel local. Actuellement, l'outil informatique de l'accueil n'est pas utilisé pour cela : il sert uniquement à la gestion globale du club et aux achats.

Les dysfonctionnements et limites du système

Ce mode de fonctionnement "hors réseau" pose trois problèmes majeurs :

1. **Risques d'erreurs administratifs :** La saisie manuelle entraîne des pertes de temps, des risques de surréservations, et rend le suivi des paiements très complexe pour les employés.
2. **Opacité pour la direction :** Les plannings restant en local dans chaque club, le siège social n'a aucune remontée d'information sur le taux de remplissage des salles.
3. **Goulet d'étranglement réseau (le problème technique principal) :** Le siège possède bien un logiciel centralisé nommé "PlanCours". Cependant, l'architecture réseau du serveur central est techniquement incapable de supporter la connexion simultanée des 883 clubs français si l'on voulait l'utiliser en direct.

Améliorations attendues

L'enjeu est de passer d'un système de gestion manuel à un outil informatisé capable de contourner la faiblesse du serveur central. Le système informatique du club doit donc évoluer : l'application de réservation sera installée localement sur les PC de l'accueil pour fonctionner de manière autonome toute la journée, et ne se connectera au serveur du siège que de façon asynchrone (en différé, par petits paquets de données) pour le mettre à jour sans le saturer.

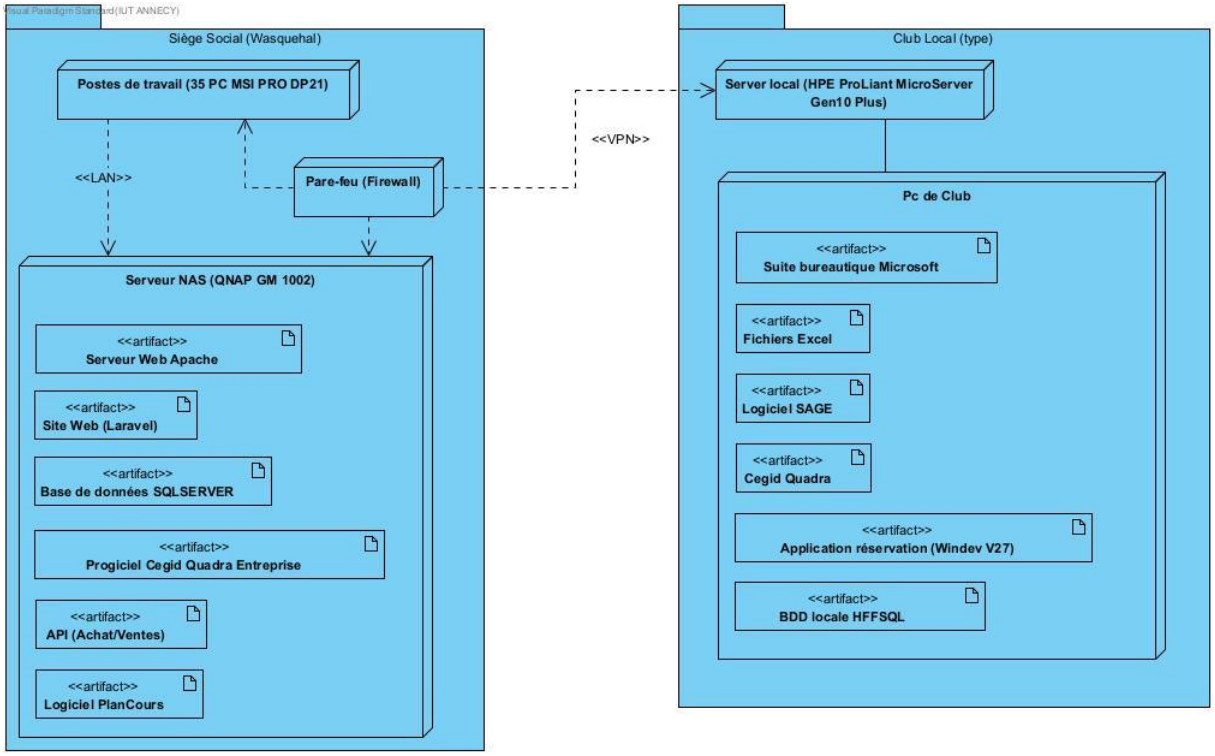


Diagramme de déploiement

Besoins fonctionnels

Cette partie définit les fonctionnalités offertes par le futur logiciel de gestion des réservations. Le système doit permettre de simplifier le travail des employés tout en assurant un suivi précis des cours.

Identification des acteurs

Deux types d'utilisateurs interagiront avec le système :

- **Employer de l'accueil (Acteur principal)** : Il effectue les opérations quotidiennes de réservation et de consultation.
- **Service Financier** : Il est chargé de la validation définitive des inscriptions. Il encaisse les règlements (chèque, virement ou espèces) et transforme les pré-inscriptions en inscriptions confirmées une fois le paiement effectué.

Diagramme des Cas d'Utilisation (Use Case)

Le diagramme suivant présente les interactions entre les acteurs cités ci-dessus et les grandes fonctionnalités du.

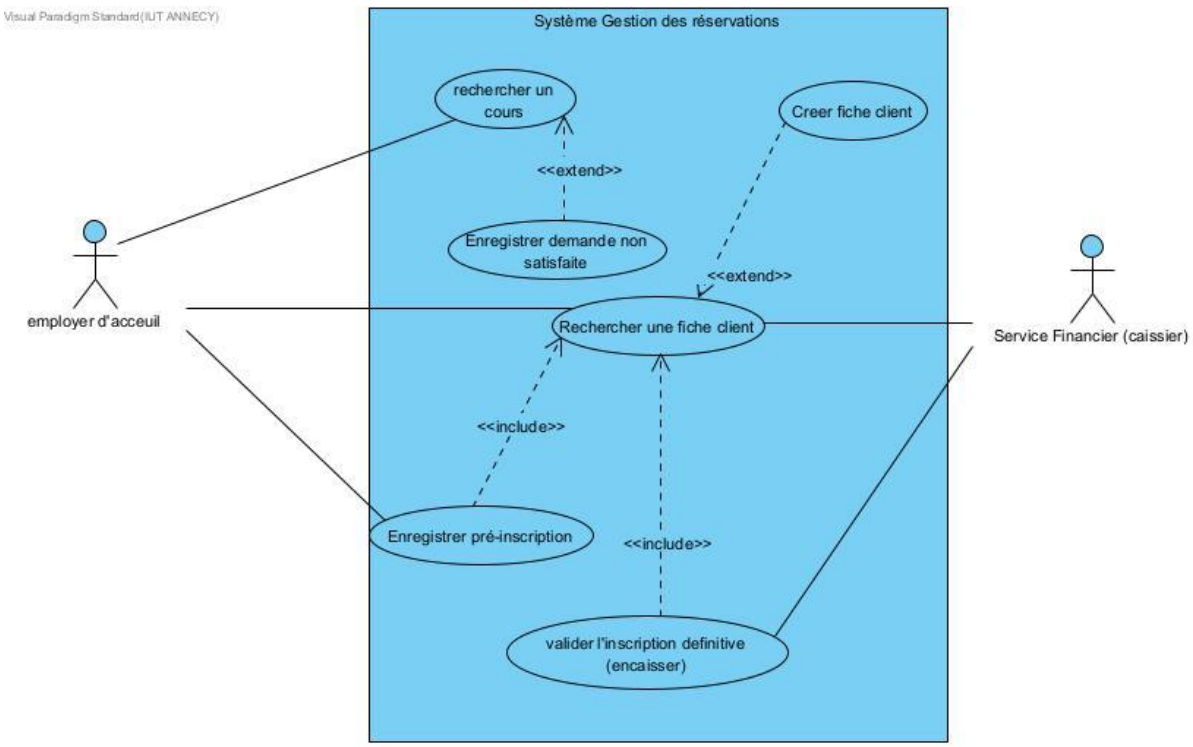


Diagramme de cas d'utilisation

UC1 — Rechercher un cours



Nom : Rechercher un cours

Acteurs : Employé d'accueil

Description : Permet à l'employé d'accueil de rechercher les créneaux disponibles pour un cours (collectif ou individuel) selon les critères demandés par le client.

Préconditions : L'employé est authentifié. Le planning de la saison est chargé dans la base locale.

Scénario nominal :

1. L'employé d'accueil ouvre le module de recherche de cours.
2. Le système affiche le formulaire de recherche.
3. L'employé sélectionne le type de cours (collectif ou individuel).
4. Le système affiche les filtres correspondants (activité, tranche d'âge, niveau ou professeur).
5. L'employé renseigne les critères communiqués par le client.
6. Le système interroge la base locale et affiche la liste des créneaux disponibles.
7. L'employé propose un créneau au client.

Scénarios d'exceptions :

- 6.A. Aucun créneau disponible : le système propose le UC « Enregistrer demande non satisfaite » (relation «extend»).
- 7.A. Le client refuse le créneau : retour au point 5.

UC2 — Créer fiche client



Nom : Créer fiche client

Acteurs : Employé d'accueil

Description : Permet de créer une nouvelle fiche client lorsque le client n'est pas encore connu du système. Étend le UC « Rechercher une fiche client ».

Préconditions : Une recherche de fiche client a été effectuée et n'a renvoyé aucun résultat.

Scénario nominal :

1. L'employé d'accueil clique sur « Nouveau client ».
2. Le système affiche le formulaire de création de fiche.
3. L'employé saisit les informations du client (nom, prénom, date de naissance, coordonnées).
4. Le système contrôle la validité des champs.
5. L'employé valide la saisie.
6. Le système enregistre la fiche en base locale et affiche un message de confirmation.

Scénarios d'exceptions :

- 4.A. Un champ obligatoire est vide ou invalide : le système affiche un message d'erreur, retour au point 3.
- 6.A. Une fiche identique existe déjà : le système alerte l'employé et propose d'ouvrir la fiche existante.

UC3 — Rechercher une fiche client



Nom : Rechercher une fiche client

Acteurs : Employé d'accueil, Service financier

Description : Permet de retrouver une fiche client existante à partir de son nom et prénom. Cas d'utilisation central inclus par plusieurs autres UC.

Préconditions : L'utilisateur est authentifié.

Scénario nominal :

1. L'utilisateur ouvre le module « Fiches clients ».
2. Le système affiche le formulaire de recherche.
3. L'utilisateur saisit le nom et/ou le prénom du client.
4. Le système interroge la base locale.
5. Le système affiche la fiche client correspondante.

Scénarios d'exceptions :

- 5.A. Aucune fiche trouvée : le système propose le UC « Créer fiche client » (relation «extend»).
- 5.B. Plusieurs fiches correspondent : le système affiche la liste, l'utilisateur sélectionne la bonne fiche.

UC4 — Enregistrer pré-inscription



Nom : Enregistrer pré-inscription

Acteurs : Employé d'accueil

Description : Permet d'inscrire provisoirement un client à un cours en attendant le règlement définitif au service financier. Inclut le UC « Rechercher une fiche client ».

Préconditions : Un créneau a été sélectionné. Le client est d'accord avec le créneau proposé.

Scénario nominal :

1. L'employé d'accueil clique sur « Pré-inscrire ».
2. Le système déclenche le UC « Rechercher une fiche client » (relation «include»).
3. L'employé confirme le client à inscrire.
4. Le système affiche le récapitulatif de la pré-inscription.
5. L'employé valide la pré-inscription.
6. Le système enregistre la pré-inscription en base locale et marque la place comme réservée.
7. Le système indique au client qu'il doit se présenter au guichet financier.

Scénarios d'exceptions :

- 6.A. La place vient d'être prise par un autre employé : le système affiche un message d'erreur, retour au UC « Rechercher un cours ».

UC5 — Enregistrer demande non satisfaite



Nom : Enregistrer demande non satisfaite

Acteurs : Employé d'accueil

Description : Permet d'enregistrer une demande de cours qui n'a pas pu aboutir (créneau complet, professeur indisponible) afin que le responsable du club puisse analyser le besoin et déclencher un éventuel recrutement. Étend le UC « Rechercher un cours ».

Préconditions : Une recherche de cours a été effectuée et aucun créneau ne convient.


Scénario nominal :

1. L'employé d'accueil clique sur « Enregistrer la demande ».
2. Le système affiche le formulaire de demande non satisfaite.
3. L'employé renseigne les critères du client (type de cours, créneaux souhaités, niveau).
4. L'employé saisit les coordonnées du client (nom, téléphone, mail).
5. L'employé valide la saisie.
6. Le système enregistre la demande en base locale.

Scénarios d'exceptions :

- 5.A. Coordonnées erronées : le système affiche un message d'erreur, retour au point 4.

UC6 — Valider l'inscription définitive (encaisser)



Nom : Valider l'inscription définitive (encaisser)

Acteurs : Service financier (caissier)

Description : Permet au service financier de transformer une pré-inscription en inscription définitive après encaissement du règlement. Inclut le UC « Rechercher une fiche client ».

Préconditions : Le client s'est présenté au guichet. Une pré-inscription existe à son nom.

Scénario nominal :

1. Le caissier ouvre le module « Validation des inscriptions ».
2. Le système déclenche le UC « Rechercher une fiche client » (relation «include»).
3. Le système affiche les pré-inscriptions associées au client.
4. Le caissier sélectionne la pré-inscription à valider.
5. Le système affiche le montant à encaisser et le mode de paiement.
6. Le caissier saisit le mode de paiement (chèque, virement, espèces).
7. Le caissier valide l'encaissement.
8. Le système marque l'inscription comme définitive et imprime le reçu.

Scénarios d'exceptions :

- 4.A. Aucune pré-inscription trouvée : le caissier informe le client et le redirige vers l'accueil.
- 7.A. Échec de l'encaissement (chèque refusé) : retour au point 5.

Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité ci-dessous illustre le processus complet de réservation d'un cours, de la demande initiale du client jusqu'à l'enregistrement définitif de l'inscription. Il met en évidence la répartition des tâches entre le client, l'employé de l'accueil et le service financier.

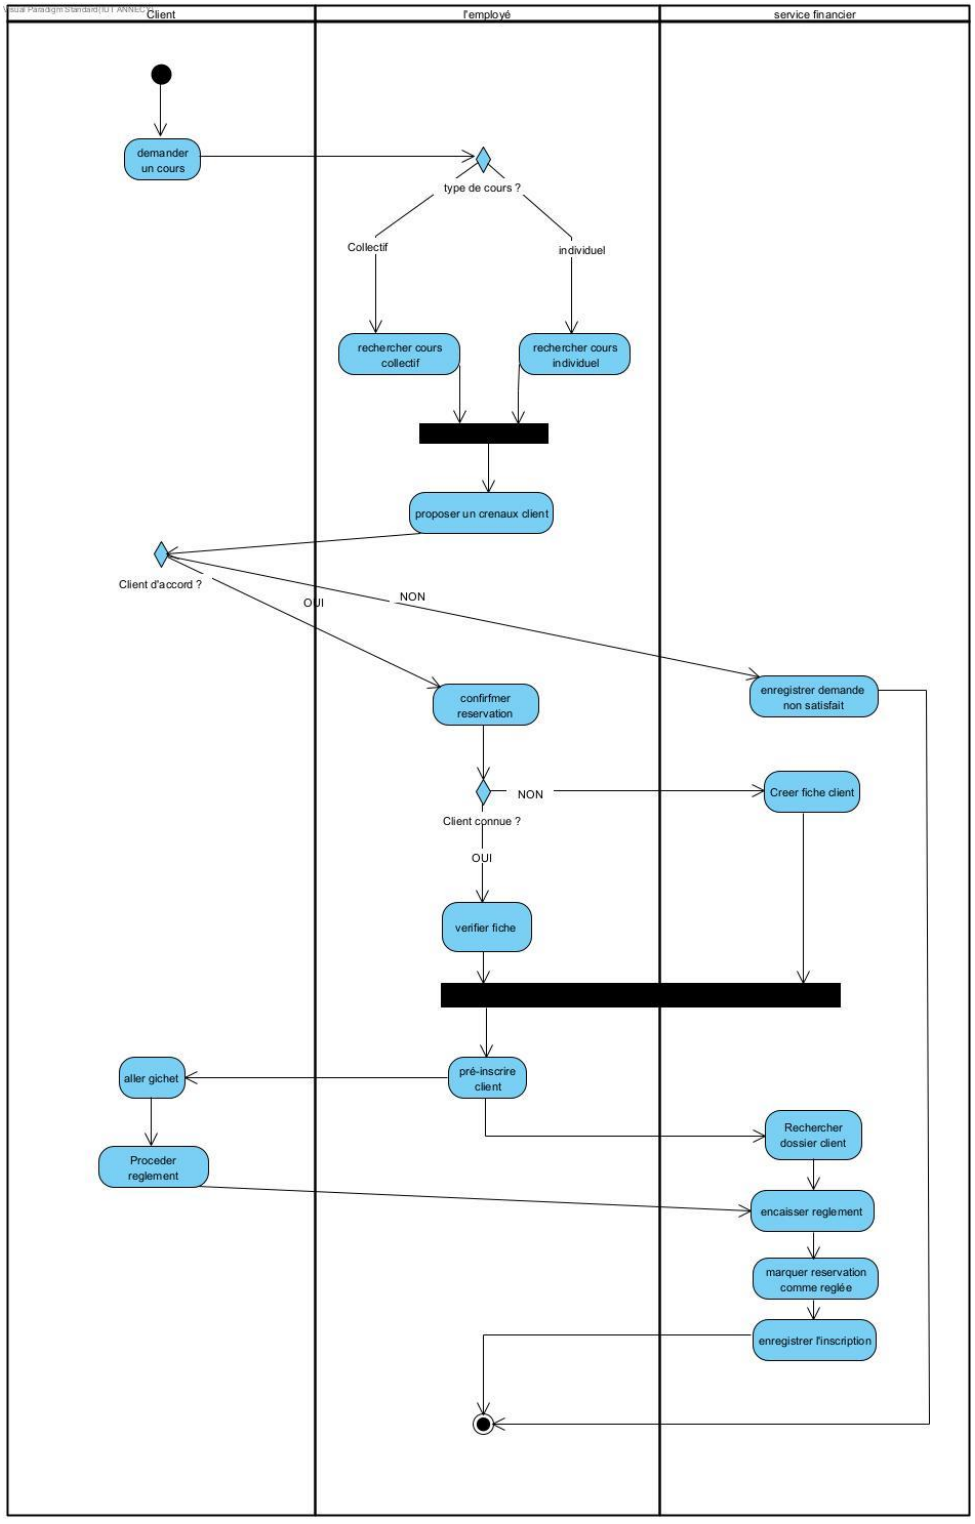


Diagramme d'activité

Diagrammes de séquences

Le diagramme de séquence détaille les échanges chronologiques entre l'utilisateur, l'interface du logiciel et la base de données locale pour l'opération la plus fréquente : la prise de réservation.

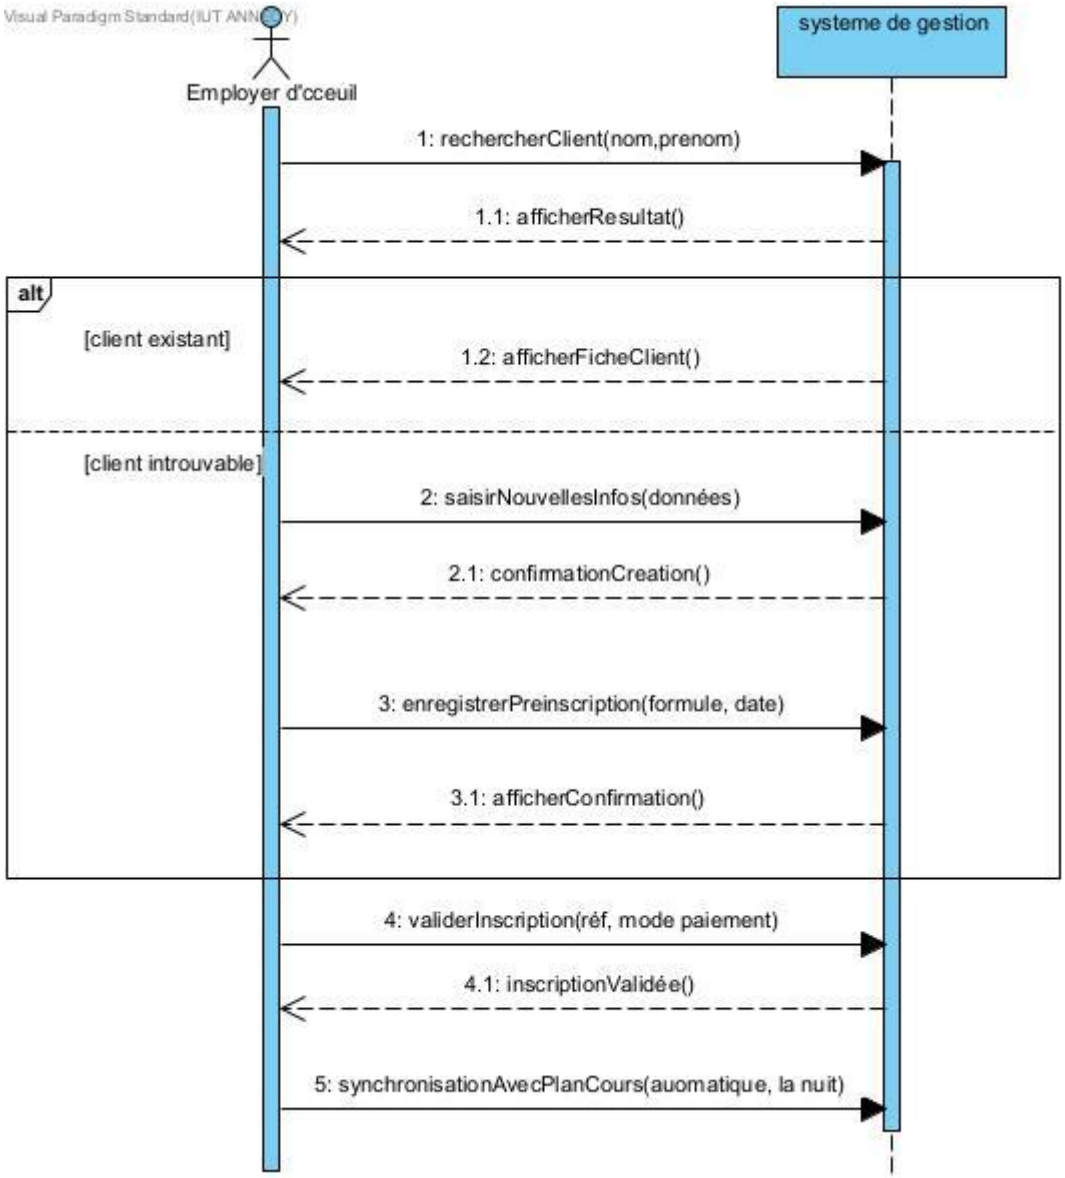


Diagramme de séquence

Besoins non fonctionnels

Fonctionnement local (Mode hors-ligne)

Le système doit pouvoir fonctionner directement sur l'ordinateur du club sans nécessiter de connexion permanente au serveur central.

Critère : L'application permet la consultation du planning et la saisie de nouvelles réservations même en cas de coupure internet.

Synchronisation asynchrone

Les échanges de données avec le logiciel "PlanCours" du siège doivent être différés pour ne pas saturer l'infrastructure réseau.

Critère : Le logiciel transmet les données de réservation au siège par paquets (batchs) à des intervalles réguliers (ex : une fois par jour).

Compatibilité matérielle

Le système doit pouvoir être installé et utilisé sur l'équipement informatique actuellement en place dans les 883 clubs.

Critère : L'application fonctionne de manière fluide sur les terminaux de l'accueil existants sans nécessiter l'achat de nouveau matériel.

Responsive Design

Bien qu'initialement prévue pour les ordinateurs de l'accueil, l'interface doit être conçue pour s'adapter à tout type de support futur.

Critère : L'affichage du logiciel s'adapte automatiquement sur un écran d'ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone.

Sécurité et gestion des droits

Le système doit garantir que chaque utilisateur n'accède qu'aux fonctionnalités correspondant à son rôle (employé d'accueil, service financier, responsable du club).

Critère : L'application propose une authentification par login et mot de passe, avec au minimum 3 profils distincts et des droits d'accès différenciés.

Performance

L'application doit rester réactive pour ne pas ralentir le travail à l'accueil et ne pas allonger le temps d'attente des clients.

Critère : Le temps de réponse des opérations courantes (recherche de cours, affichage du planning, enregistrement d'une réservation) ne dépasse pas 2 secondes.

Contrainte de délais

Le projet est soumis à un impératif calendaire strict fixé par la direction de Basic-Fit.

Critère : La solution logicielle est entièrement testée et mise en production dans les 883 clubs pour le début du mois de janvier 2027.

Étude des solutions, Risques et Hiérarchisation

Étude de la solution technique et méthodologique

Pour répondre au problème majeur de l'infrastructure réseau (le serveur central ne pouvant supporter 883 connexions simultanées), la solution retenue est le développement d'une **application "Offline-First" (à fonctionnement local)**.

Sur le plan technique : L'application sera installée directement sur les postes informatiques actuels de l'accueil de chaque club. Elle sera couplée à une petite base de données locale sécurisée. L'application gérera toutes les réservations de la journée en totale autonomie. Un script de **synchronisation asynchrone** sera développé pour compiler ces données et les envoyer au serveur central ("PlanCours") sous forme de petits paquets, lors des heures creuses (la nuit) ou à intervalles réguliers, évitant ainsi toute surcharge.

Sur le plan méthodologique : Le Chef de Projet n'ayant pas d'expérience en développement informatique, la solution retenue pour l'organisation du travail est l'utilisation d'une **méthode Agile (comme Scrum)**. Cela permettra de découper le projet en petites étapes (sprints) et d'assurer un suivi régulier avec la MOA sans le perdre dans des processus informatiques trop lourds.

Étude rapide des risques

Plusieurs risques ont été identifiés pour le bon déroulement de ce projet :

Risques techniques : Des conflits de données lors de la synchronisation asynchrone entre la base locale du club et le serveur central (ex: bugs de mise à jour des plannings).

Risques organisationnels : Le manque d'expérience du Chef de Projet en développement logiciel, qui pourrait entraîner des retards si les tâches de l'équipe de développement (MOE) sont mal évaluées.

Risques calendaires et logistiques : Le déploiement simultané du logiciel sur les 883 clubs français avant janvier 2027 est un véritable défi logistique. Un retard de livraison bloquerait tout le réseau.

Risques humains (Conduite du changement) : Le personnel de l'accueil, habitué à la souplesse du papier ou d'Excel, pourrait rejeter la nouvelle application si elle est jugée trop complexe ou lente.

ID	Nature	Description	Gravite	Probabilité	Action correctrice
R1	Besoins	Spécifications ambiguës (conséquence de l'échec 2020)	Catastrophique	Très probable	Ateliers réguliers avec la MOA + validation itérative en Scrum
R4	Besoins	Demandes de changements en cours de projet (annoncées)	Catastrophique	Très probable	Backlog produit priorise + gouvernance des évolutions validée par le bailleur
R23	Déploiement	Sabotage / résistance des utilisateurs (héritage 2020)	Grave	Probable	Implication forte de la cellule conduite du changement, formations + demos
R11	Technique	Environnement technique peu maitrise	Grave	Probable	Démarrer directement sur V27 + formation de l'équipe en amont du dev
R26	Gestion projet	Chef de projet sans expérience en dev logiciel	Grave	Probable	Lettre de mission précise + accompagnement par un dev senior du siège
R28	Gestion projet	Incompatibilité délai/cout/qualité (883 clubs en janvier 2027)	Catastrophique	Probable	Déploiement par vagues (pilote Macon/Annecy/Pringy, puis généralisation)
R25	Déploiement	Sous-estimation de la maintenance (sous-traitant VCOUT sans contrat)	Grave	Probable	Négocier un contrat de maintenance forfaitaire dès la livraison
R30	Gestion projet	Maitrise RGPD (données personnelles adhérents)	Grave	Peu probable	Audit RGPD dès la conception (privacy by design) + DPO groupe consulte

Tableau 7.1 — Top 8 des risques critiques (extrait de la matrice des 30 risques)

Hiérarchie dans les besoins

Afin d'optimiser le temps de développement et de garantir la livraison pour janvier 2027, les besoins ont été hiérarchisés de la manière suivante :

1. Besoins Critiques (Priorité Absolue - Le cœur du système)

- Fonctionnement 100% local (hors-ligne) sur les PC de l'accueil.
- Fonctionnalités de base de réservation (ajouter, supprimer un participant à un cours).
- Synchronisation asynchrone sécurisée avec le siège.

2. Besoins Majeurs (Priorité Haute - L'administration)

- Interface de création et de modification des plannings par les responsables.
- Consultation de la liste des inscrits par les moniteurs.

3. Besoins Secondaires (Priorité Basse - Les évolutions futures)

- Le *Responsive Design* (adaptation parfaite sur smartphones et tablettes). Le logiciel devant prioritairement tourner sur les PC de l'accueil existants, l'affichage mobile est un confort qui pourra être perfectionné dans une version ultérieure si le temps manque.

Planning prévisionnel

Le calendrier ci-dessous découpe le projet en 5 phases principales sur la période avril 2026 — janvier 2027. La mise en production dans les 883 clubs français est fixée au 4 janvier 2027 (impératif directorial non négociable).

Phase	Période	Livrables	Durée	Responsable
1	Cahier des charges (avril-juin 2026)	CdC valide, spécifications UML	10 semaines	MOE (étudiants) + MOA
2	Dossier gestion de projet (mai 2026)	PERT, Gantt, matrice risques	3 semaines	Chef de projet
3	Développement (sept-nov 2026)	Sprints Scrum, modules livres par lots	12 semaines (6 sprints)	MOE + dev siege
4	Recette & pilote (décembre 2026)	Tests MOA sur 3 clubs pilotes (Macon, Annecy, Pringy)	4 semaines	MOA + MOE
5	Déploiement 883 clubs (janvier 2027)	Mise en production généralisée	2 semaines	Informaticiens locaux + VCOUT

Tableau 8.1 — Planning prévisionnel macroscopique


NOTE : Un diagramme de Gantt détaille sera livre dans le dossier de gestion de projet (échéance 7 mai 2026), avec décomposition en taches et jalons, analyse du chemin critique par la méthode PERT, et identification des dépendances inter-taches.

Annexe — Maquettes principales

Les maquettes suivantes illustrent les écrans clés de l'application et serviront de base aux développements. Elles seront validées par la MOA (Mme Lacroix) avant le démarrage des sprints.


Écran 1 — Menu des profils


Écran d'accueil affichant les différents profils utilisateurs. L'utilisateur sélectionne son profil pour accéder aux fonctionnalités qui lui sont autorisées.

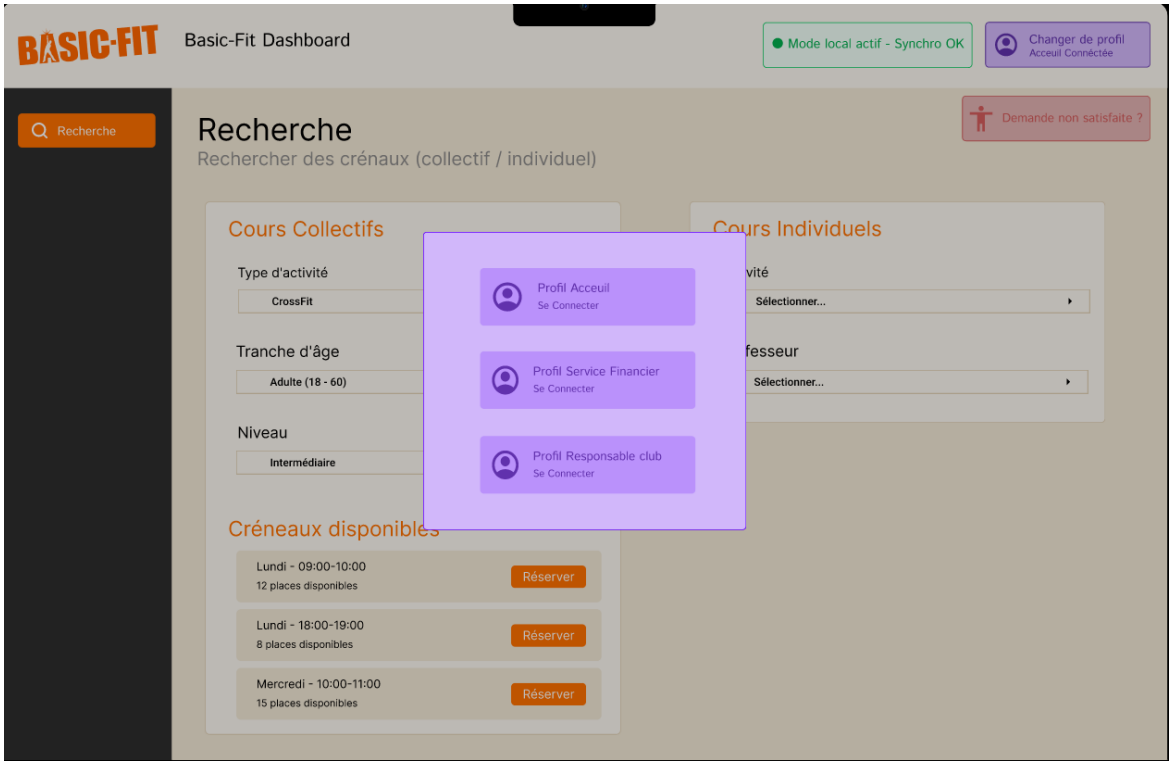

Écran 2 et 3 — Recherche de cours et inscription


Destiné à l'employé d'accueil, cet écran permet de rechercher un créneau horaire pour un cours collectif ou individuel selon les critères du client. En cliquant sur « Réserver », l'employé peut associer la réservation à un client existant ou créer une nouvelle fiche client, puis valider l'inscription en précisant le mode de paiement.

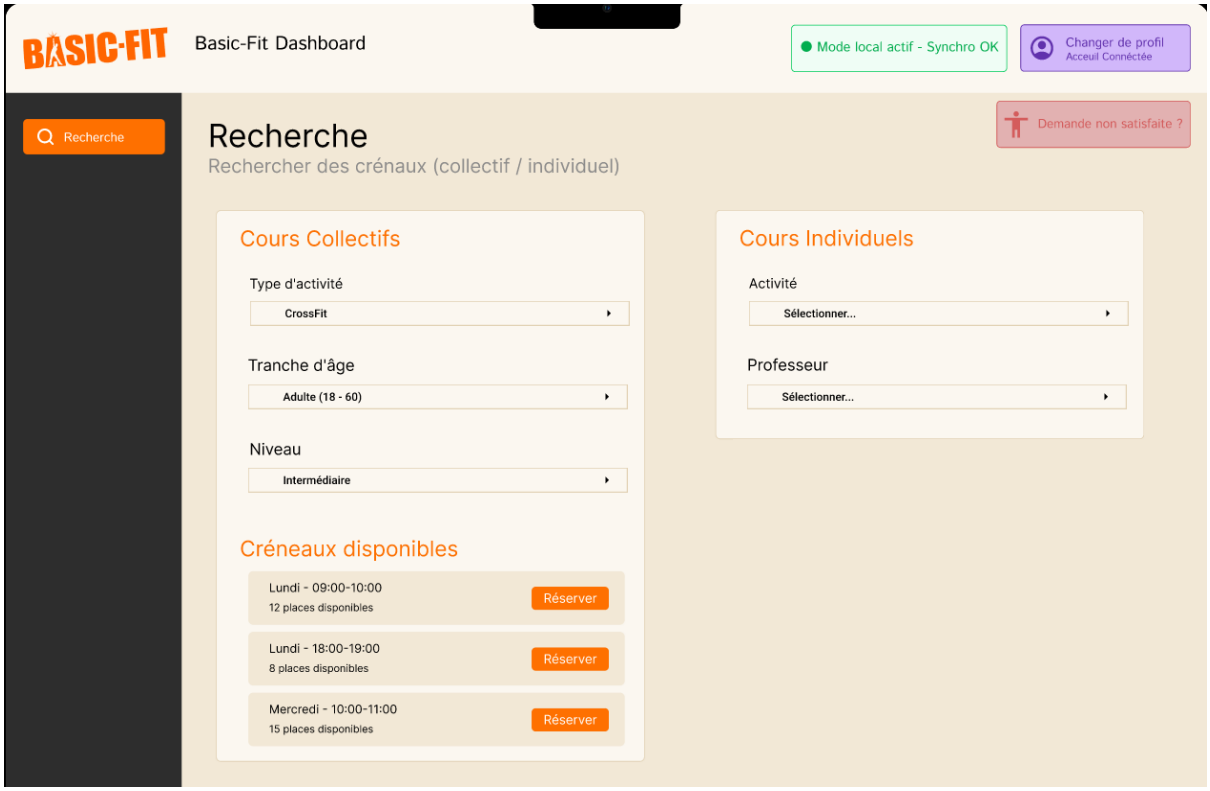

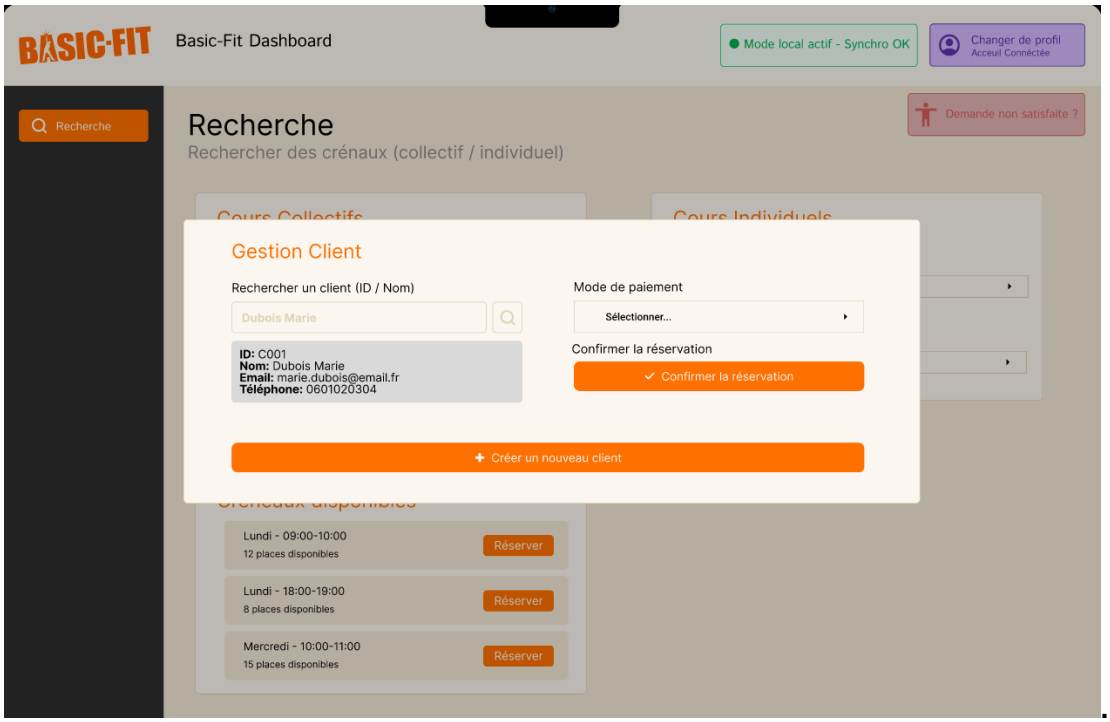


Écran 4 — Demande non satisfaite

Si aucun créneau disponible ne convient au client, l'employé enregistre une demande non satisfaite via le bouton rouge. Les informations du client et ses critères sont conservés pour analyse ultérieure..

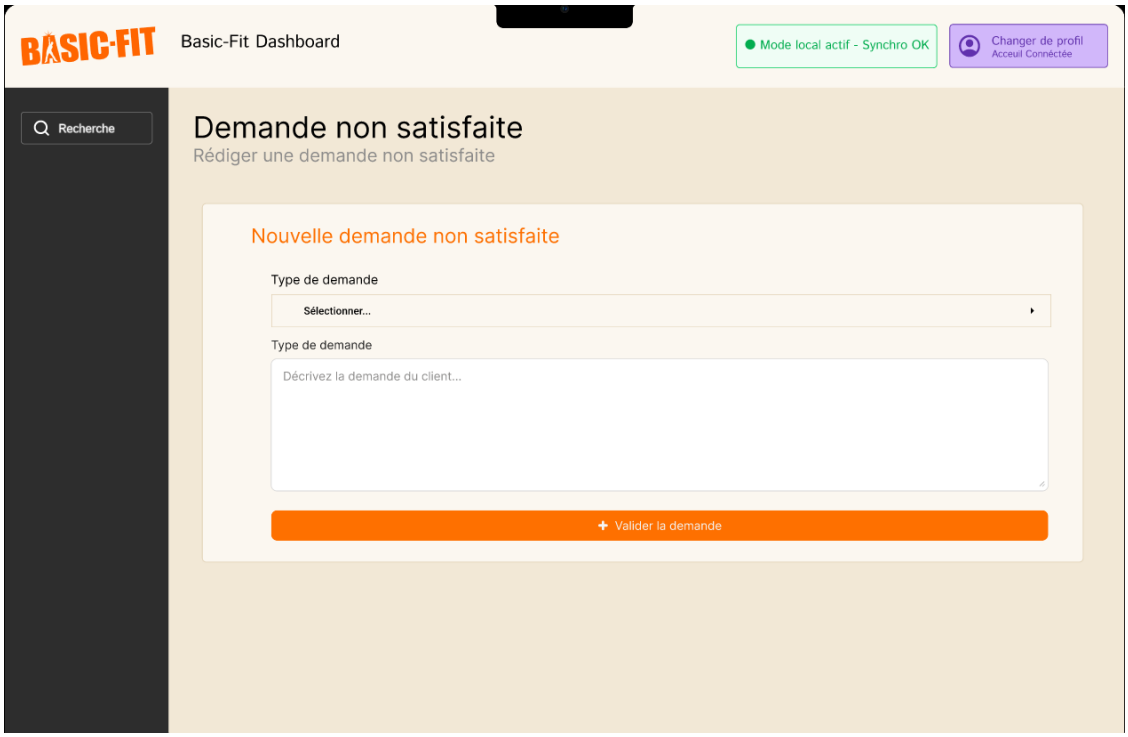


Écran 5 — Encaissement (service financier)

Écran dédié au service financier. Il permet d'encaisser un règlement (chèque ou virement) et de marquer la réservation correspondante comme « réglée ».

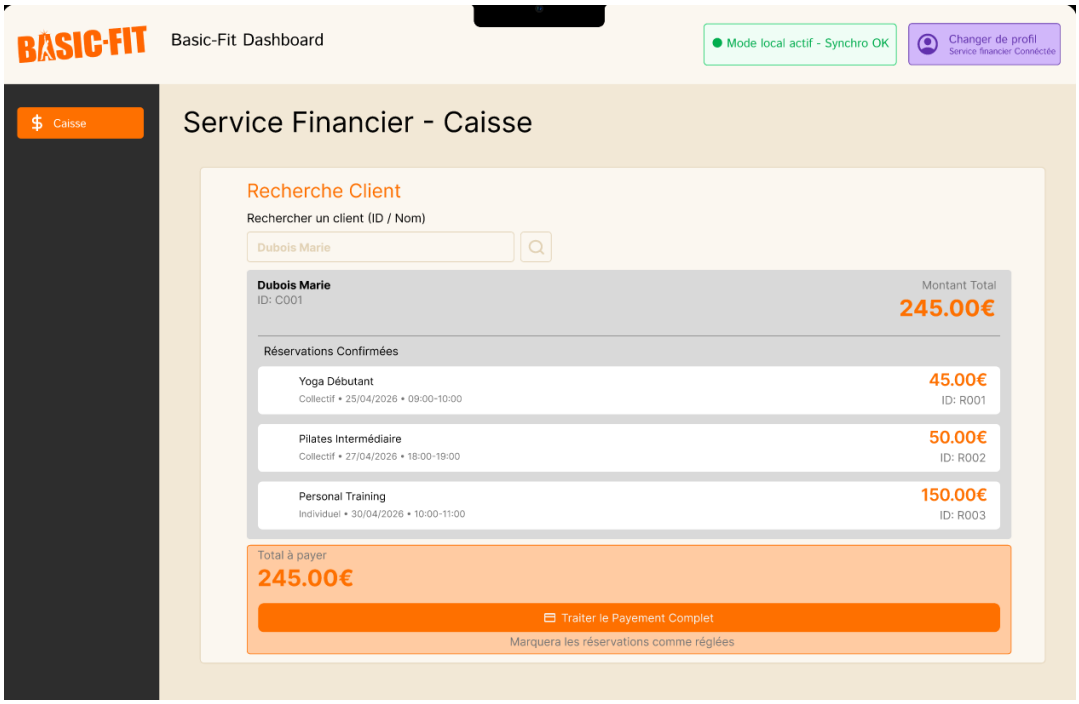


Écran 6 — Suivi des demandes (responsable du club)

Écran destiné au responsable du club. Il affiche la liste des demandes non satisfaites et permet de déclencher une demande de recrutement auprès du siège si le volume le justifie.

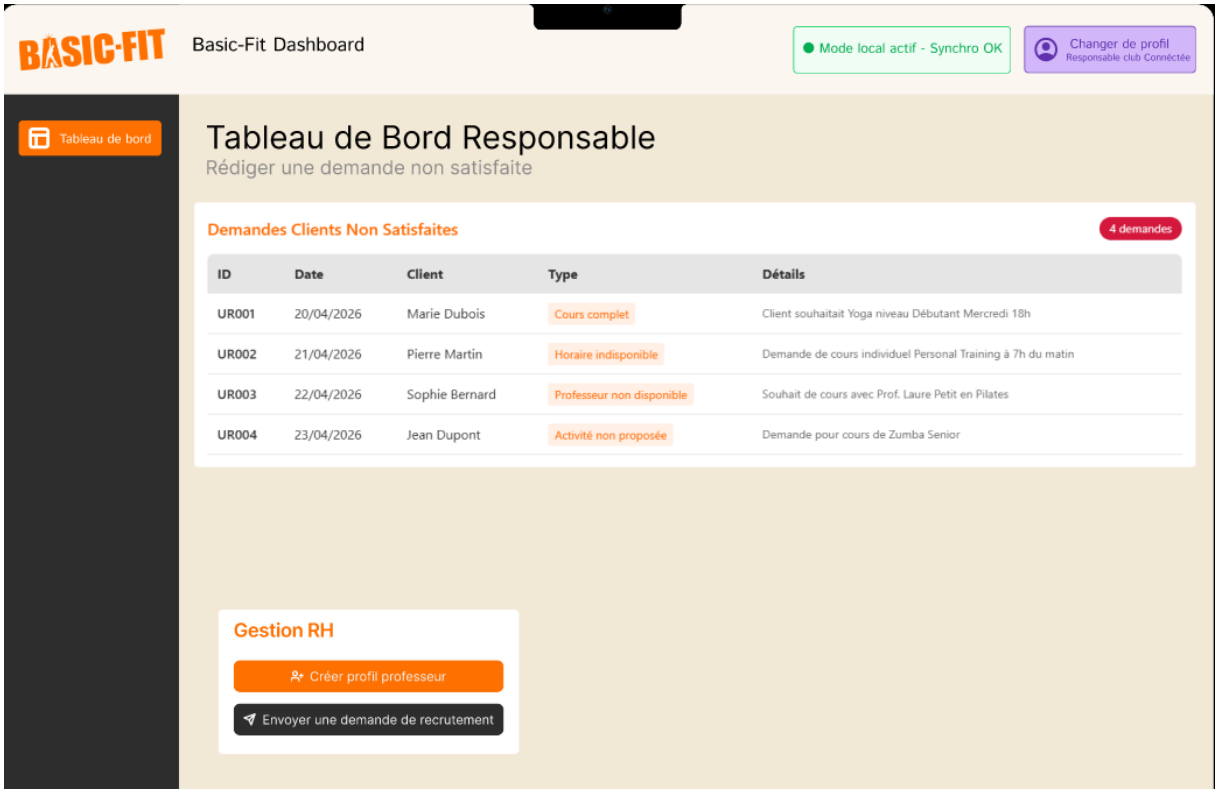

Navigation entre les pages

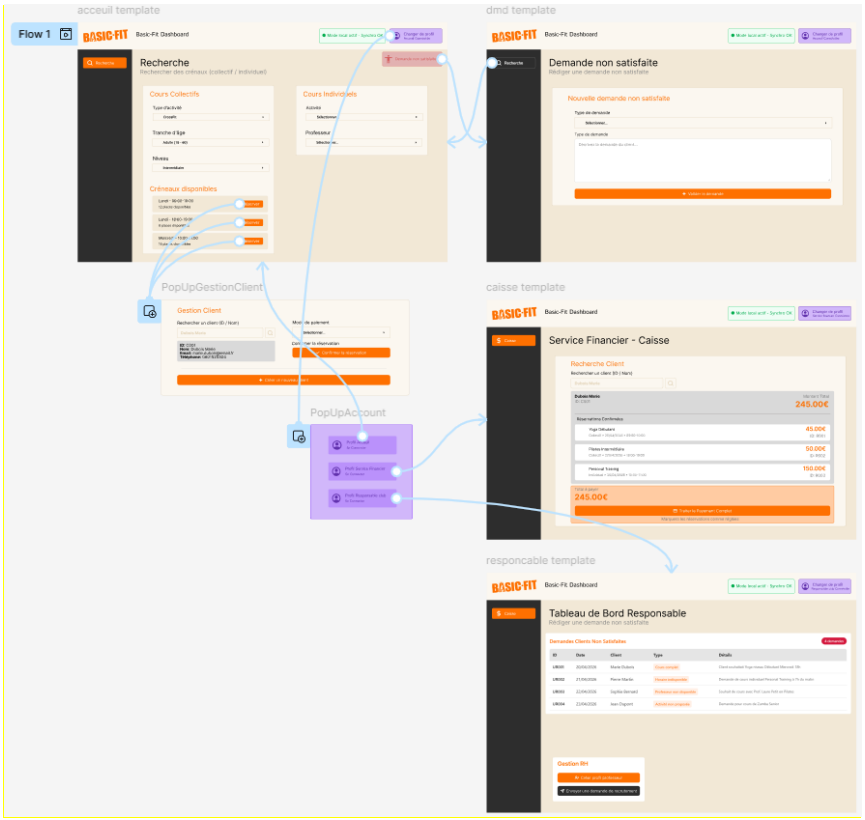

Glossaire

Terme	Définition
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line. Technologie d'accès Internet par ligne téléphonique.
API	Application Programming Interface. Interface permettant à deux logiciels de communiquer entre eux.
Asynchrone (synchronisation)	Mode d'échange de données différé : les informations sont transmises par lots à intervalles planifiés, sans connexion permanente.
Batch	Traitement par lot exécuté automatiquement à une heure planifiée (souvent nocturne).
Cegid Quadra	Progiciel de gestion comptable et de paie utilisé par Basic-Fit.
HFSQL	Moteur de base de données natif de Windev, utilisable en mode local ou Client/Serveur.
HPE ProLiant	Gamme de serveurs professionnels Hewlett Packard Enterprise.
MOA	Maîtrise d'Ouvrage. Partie prenante qui exprime le besoin et valide la conformité du livrable.
MOE	Maîtrise d'Œuvre. Équipe chargée de concevoir et réaliser la solution technique.
NAS	Network Attached Storage. Serveur de stockage connecté en réseau.
Offline-First	Architecture où l'application fonctionne d'abord en local sans connexion, la synchronisation étant secondaire.
PlanCours	Logiciel centralisé du siège de Basic-Fit pour la gestion des plannings de cours.
QNAP	Fabricant taïwanais de serveurs NAS. Modèle cité : GM 1002.
Responsive design	Conception d'interface s'adaptant automatiquement à la taille de l'écran (PC, tablette, smartphone).

Terme	Définition
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données. Cadre légal européen applicable depuis 2018.
SAGE	Éditeur de logiciels de gestion ; ici, logiciel point de vente utilisé en club.
Scrum	Méthode de gestion de projet Agile basée sur des sprints courts et itératifs.
Sprint	Itération de développement en méthode Agile, durant généralement 2 à 4 semaines.
UML	Unified Modeling Language. Langage standardisé de modélisation pour la conception logicielle.
VCOUT	Société de services informatiques basée à Annecy, prestataire de maintenance applicative.
WAN	Wide Area Network. Réseau informatique étendu (par opposition au LAN local).
Windev	Atelier de génie logiciel édité par PC SOFT, utilisé pour développer des applications Windows.
